


PROVE.

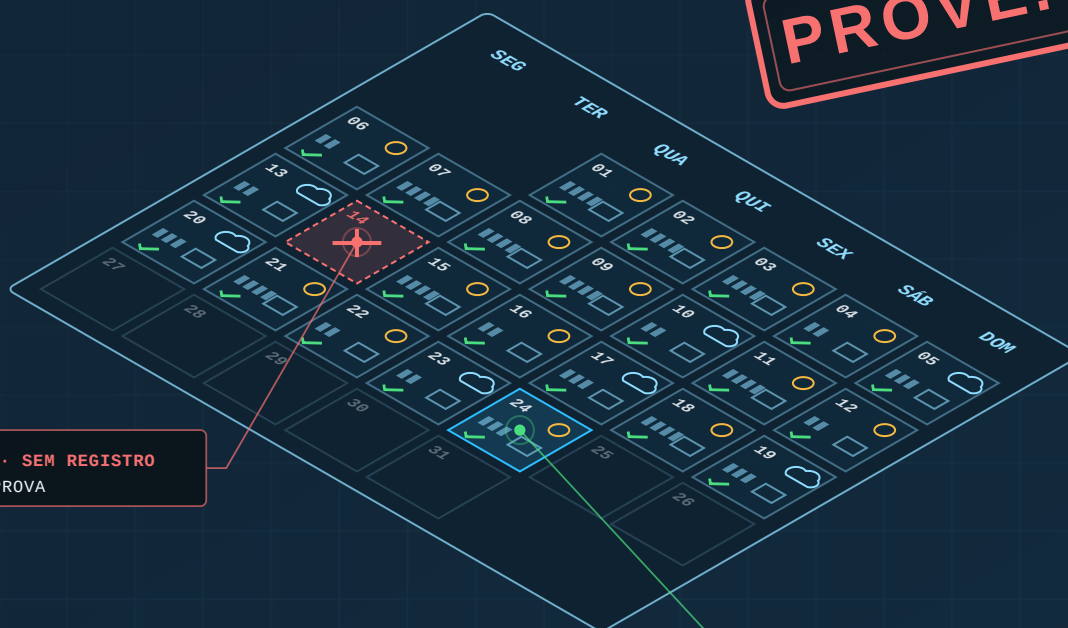

⚠ DIA 14 · SEM REGISTRO
FATO SEM PROVA

✓ RDO DIÁRIO · ASSINADO
CLIMA · EFETIVO · FOTOS

DIÁRIO DE OBRA · OUTUBRO

RDO AUTOMATIZADO

CONFORMIDADE E DEFESA CONTRATUAL

RDO Automatizado: Quem Não Registra, Não Prova.

Conformidade não é papelada. É a sua defesa no dia em que o contrato virar disputa.

Sumário executivo

Tese executiva: na disputa, vence quem prova o que aconteceu, não quem tem razão. O RDO preenchido na sexta-feira pela semana inteira é um documento fraco. **O RDO capturado no momento, com foto, clima e ciência do contratante, é a melhor defesa que uma construtora pode ter.**

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Nº 1

causa global de disputas na construção: **pleitos mal elaborados, incompletos ou sem fundamentação.**¹

15,4

meses é a duração média global de uma disputa de construção.¹

R\$ 29 bi

em novas arbitragens no Brasil em 2023. **Construção civil e energia** ficaram em 2º lugar, em número de casos e em valor.²

52%

das obras contratadas com recursos federais **estavam paralisadas** em 2024.³

RECOMENDAÇÕES

- ✓ **Registre no dia, não na sexta:** prova feita depois vale menos.
- ✓ **Registre o que impede, não só o que avança:** chuva, falta de frente e atraso de projeto viram prazo e dinheiro.
- ✓ **Dê ciência ao contratante:** registro unilateral defende pouco.

PREMISSA ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO


Até 2028, construtoras com RDO capturado em tempo real e com ciência das partes terão pleitos de prazo e de reequilíbrio aceitos com mais frequência e resolvidos em menos tempo.

PROJEÇÃO PILLIER

Telemetria: o preço de *não provar*.



FIGURA 1. LINHA DO TEMPO DE UMA DISPUTA

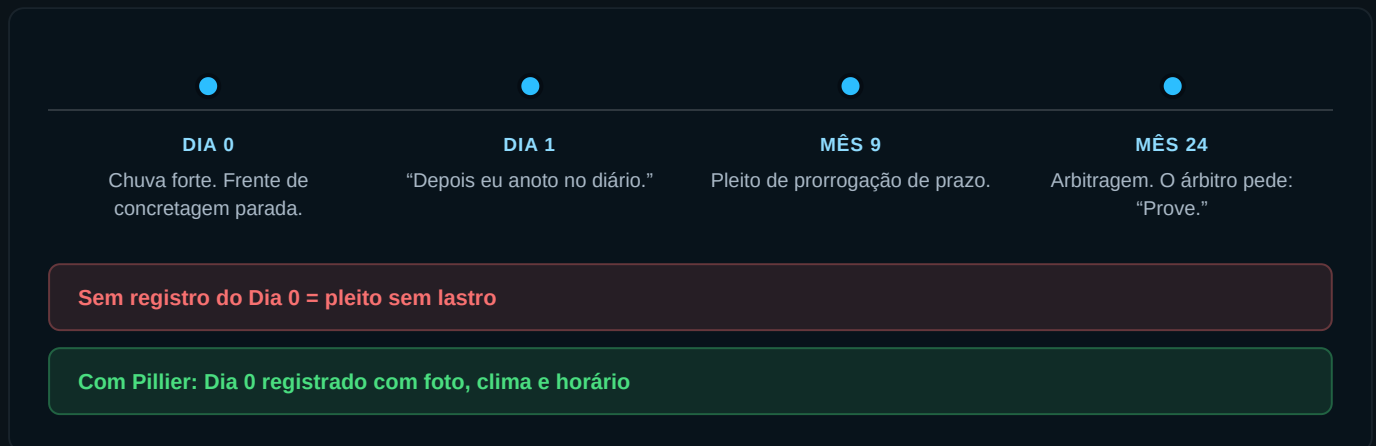

Cenário ilustrativo. A duração reflete a média global de 15,4 meses para resolução de disputas.¹

ILUSTRATIVO

CALCULADORA DO DIA NÃO REGISTRADO

R\$ 20 mi CONTRATO × 0,1% MULTA/DIA = R\$ 20 mil POR DIA

R\$ 20 mil POR DIA × 18 DIAS DE CHUVA

= **R\$ 360 mil** de exposição que um RDO poderia ter defendido.

Exemplo hipotético; os percentuais de multa variam por contrato.

ILUSTRATIVO

O RDO VIROU OPCIONAL. E ISSO É UM RISCO.

Fev/2023: o Confea revogou a obrigatoriedade do Livro de Ordem no sistema Confea/Crea.⁴

Na obra pública, o fiscal do contrato continua obrigado a registrar as ocorrências.⁵

Resultado: o contratante tem o registro dele. E você, tem o seu?

Anatomia de um RDO *frágil*.

O paradoxo: quase toda obra tem diário. Quase nenhum diário resiste a uma perícia.

FIGURA 2. TRÊS FALHAS QUE DERRUBAM UM RDO

FALHA 1 · O RDO ATRASADO

PREENCHIDO DEPOIS

Escrito na sexta, por memória, para a semana inteira. Perde credibilidade na primeira pergunta do perito.

FALHA 2 · O RDO GENÉRICO

“SERVIÇOS NORMAIS”

Sem clima, sem efetivo, sem impedimento. Registra que houve um dia, não o que aconteceu nele.

FALHA 3 · O RDO UNILATERAL

SEM CIÊNCIA

O contratante nunca viu. Na disputa, vira a palavra de uma parte contra a outra.

ANATOMIA DE UM RDO À PROVA DE DISPUTA

✓ **Data e hora reais** da captura

✓ **Efetivo e equipamentos** em campo

✓ **Impedimentos** e ocorrências

✓ **Ciência** do contratante

✓ **Clima por turno**

✓ **Serviços executados por frente**

✓ **Fotos georreferenciadas**

MODELO CONCEITUAL

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO E MITIGAÇÃO

MÉTRICA DE RISCO	NÍVEL 1 (CONVENCIONAL)	IMPACTO	MITIGAÇÃO (PILLIER)
Momento do registro	Fim da semana, por memória.	Credibilidade baixa na perícia.*	Captura no momento, com data e hora.
Impedimentos	Raramente anotados.	Pleito sem lastro. ¹	Impedimento registrado com foto e clima.
Evidência	Fotos soltas no celular.	Prova contestável.*	Foto vinculada ao dia, à frente e ao local.
Ciência das partes	Assinatura mensal, quando há.	Registro unilateral.*	Envio diário ao contratante.


* Estimativas ilustrativas Pillier a partir de observação de campo; demais linhas apoiam-se nas fontes citadas.

ILUSTRATIVO

O motor do *RDO automático*.

Do caderno à prova: o Pillier monta o RDO a partir do que a equipe já faz no canteiro, sem formulário e sem digitação no fim do dia.

FIGURA 3. PIPELINE — DO CANTEIRO AO DOCUMENTO DEFENSÁVEL

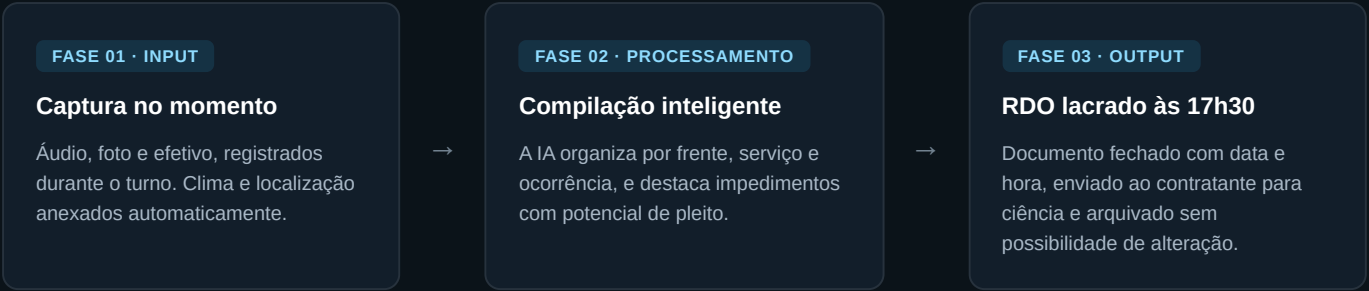

Arquitetura do produto Pillier. **ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO**

MATRIZ DE CAPACIDADES TÉCNICAS

1. RDO por voz

O encarregado fala; **a IA escreve o diário.**

2. Radar de pleitos

Cada impedimento registrado vira um **dia potencial de prorrogação**, contado automaticamente.

3. Ciência automática

O contratante recebe o RDO no mesmo dia. **O silêncio dele também fica registrado.**


4. Dossiê em 1 clique

Todos os registros de um evento (fotos, clima, efetivo, mensagens) **reunidos para o pleito ou a perícia.**

Modelo de maturidade do *registro de obra*.

Onde está a sua construtora?

FIGURA 4. MATRIZ — TEMPESTIVIDADE DO REGISTRO × FORÇA PROBATÓRIA

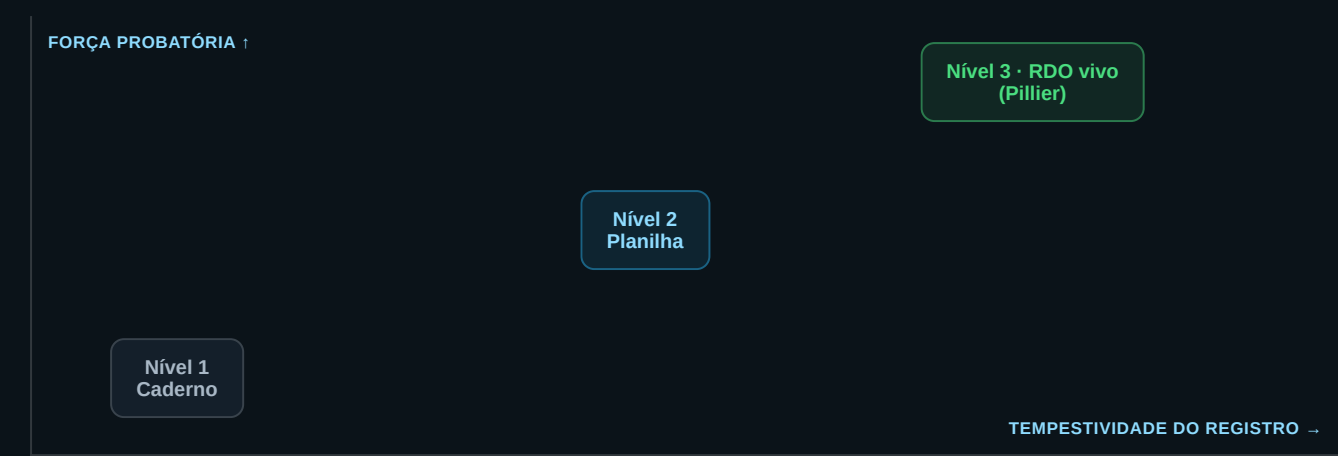

Modelo de maturidade Pillier. Posições conceituais, não medições. **MODELO CONCEITUAL**

Nível 1 · Caderno

RISCO CRÍTICO

- Papel, quando há.
- Preenchido depois.
- Sem foto e sem ciência.

Nível 2 · Planilha

TRANSIÇÃO

- Digital, mas manual.
- Fotos separadas do registro.
- Assinatura mensal.

Nível 3 · RDO vivo

PILLIER AI

- ▶ Captura no momento.
- ▶ Lacrado diariamente.
- ▶ Ciência automática do contratante.

Roadmap de execução de **90 dias**.

● Mês 1 · Registrar no dia

Meta: 100% dos RDOs fechados no próprio dia, com foto e clima.

● Mês 2 · Registrar o que impede

Meta: todo impedimento registrado no momento e contado como dia potencial de pleito.

● Mês 3 · Dar ciência

Meta: RDO enviado diariamente ao contratante, com dossiê pronto para qualquer pleito.

FONTES E METODOLOGIA

1. **Arcadis**. 2022 Global Construction Disputes Report. — Dados de 2021: valor médio global de disputa de US\$ 52,6 milhões; duração média global de 15,4 meses. Causa nº 1: pleitos mal elaborados, incompletos ou sem fundamentação; nº 2: erros e omissões no contrato.
2. **Lemes, Selma (coord.)**. Arbitragem em Números: Pesquisa 2022/2023. Canal Arbitragem, 2024. — 318 novas arbitragens em 2023, somando R\$ 29 bilhões nas oito principais câmaras do país; contratos de construção civil e energia em 2º lugar, em número de casos e em valor.
3. **Tribunal de Contas da União (TCU)**. Diagnóstico de obras paralisadas, 2024. — 11.941 obras financiadas com recursos federais paralisadas, equivalentes a 52% das contratações vigentes.
4. **Confea**. Decisão plenária de fevereiro de 2023 que revogou a Resolução nº 1.094/2017 (Livro de Ordem de obras e serviços).
5. **Legislação brasileira**. Lei nº 14.133/2021, art. 117 (registro de ocorrências pelo fiscal do contrato); NR-18 (condições de segurança e saúde no trabalho na indústria da construção).

Nota metodológica. Os indicadores marcados com *Estimativa Pillier*, *Ilustrativo*, *Modelo conceitual*, *Projeção Pillier* ou *Especificação de produto* são estimativas direcionais, cenários analíticos ou especificações de produto — não medições auditadas nem atribuídas às fontes acima. A Calculadora do dia não registrado usa valores hipotéticos; multas e critérios de prorrogação variam por contrato. Cifras internacionais referem-se aos mercados dos estudos originais. Este documento tem caráter informativo e não constitui aconselhamento jurídico.

Transforme o diário em defesa.

Cada dia registrado hoje é um argumento a seu favor amanhã.

DESCUBRA O PILLIER
